度量與分析(MA)作業規範

文件編碼：SDMS3-MA-001

版　　次：A

機密等級：□機密　■密　□普通

發佈日期：2008-03-31

發佈單位：EPG

總 頁 次：8

發行單位簽核			

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

修 訂 履 歷

版次	變更單編號	發行日期	作者	修 訂 內 容	備 注
A		2008-03-31	李雷	初版發行	
B		2008/8/7	李雷	修訂,加入組織級 MA 規程	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

目　　錄

1. 目　　的 3
2. 適用範圍 3
3. 名詞解釋 3
4. 參考文件 3
5. 權　　責 3
6. 允入準則 4
7. 輸入 4
8. 作業流程與說明 4
9. 允出準則 7
10. 輸出 7
11. 需要的知識與技能 7
12. 需要的監督和控制 7
13. 裁剪指南 7
14. 附件目錄 7

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

1. 目　　的

1-1. 提供給專案級 MA 工程師對專案執行度量與分析之依據。

1-2. 提供給組織級 MA 工程師對組織執行的度量與分析之依據。

1-3. 通過客觀收集專案開發過程中的資料，提供正確的資訊，以便上級主管作出正確的決策，並作後續專案運作的參考和流程改善，提升組織之軟體能力成熟度。

1-4. 通過客觀收集組織級資料，為組織運營方向提供依據。

2. 適用範圍

2-1. 適用於 FIH 系統資訊處（一）所有需要進行度量的過程域; 對於專案級度量與分析過程貫穿在專案全生命週期。

3. 名詞解釋

3-1. 參考《SDMS2-001_名詞解釋》

4. 參考文件

4-1. 《SDMS3-PM-001_專案規劃與監控作業規範》

4-2. 《SDMS3-REQM-001_需求開發與管理作業規範》

4-3. 《SDMS3-CM-001_配置管理作業規範》

4-4. 《SDMS3-PPQA-001_過程與質量保證過程規範》

4-5. 《SDMS4-PM-018_專案問題追蹤表》

5. 權　　責

5-1. EPG

5-1-1. 制定專案級和組織級度量元

5-1-2. 修訂和擴充度量元

5-1-3. 制定各度量元閾值標準

5-2. 專案級 MA 工程師

5-2-1. 確立專案度量目標。

5-2-2. 制訂「專案級度量與分析計劃表」。

5-2-3. 專案結束時匯總產生「總體專案度量與分析報告」。

5-3. 組織級 MA 工程師

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5-3-1. 制訂「組織級度量與分析計劃表」

5-3-2. 匯總各專案「總體專案度量與分析報告」，並放入組織級度量庫，組織間共享度量數據

5-3-3. 協助制定各度量元閾值標準

5-4. 專案成員(CM，PM，PPQA，TE，SA，SD，PGM 角色)

5-4-1. 參與度量資料的收集，並記錄相關的背景資訊

5-4-2. 使用度量結果來幫助識別和糾正問題

5-4-3. 執行本角色所負責的度量元的度量

5-4-4. 協助 PM 完成「總體專案度量與分析報告」

5-5. 上級主管

5-5-1. 為在組織內實施度量活動提供足夠的資源，支持度量活動的執行

5-5-2. 審查「總體專案度量與分析報告」，瞭解各專案運作狀況。

6. 允入準則

6-1. 「客戶需求書」通過客戶審查，即專案已啟動

6-2. 專案成員已確定，具備相應技能的 MA 人員已就緒

6-3. 組織級、專案級度量目標都已確立

7. 輸入


可以參考的度量過程、資料收集和存儲辦法、資料分析和報告辦法、度量構造說明

8. 作業流程與說明

作業流程

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

文件編碼：SDMS3-MA-001	度量與分析(MA)作業規範	版次: A

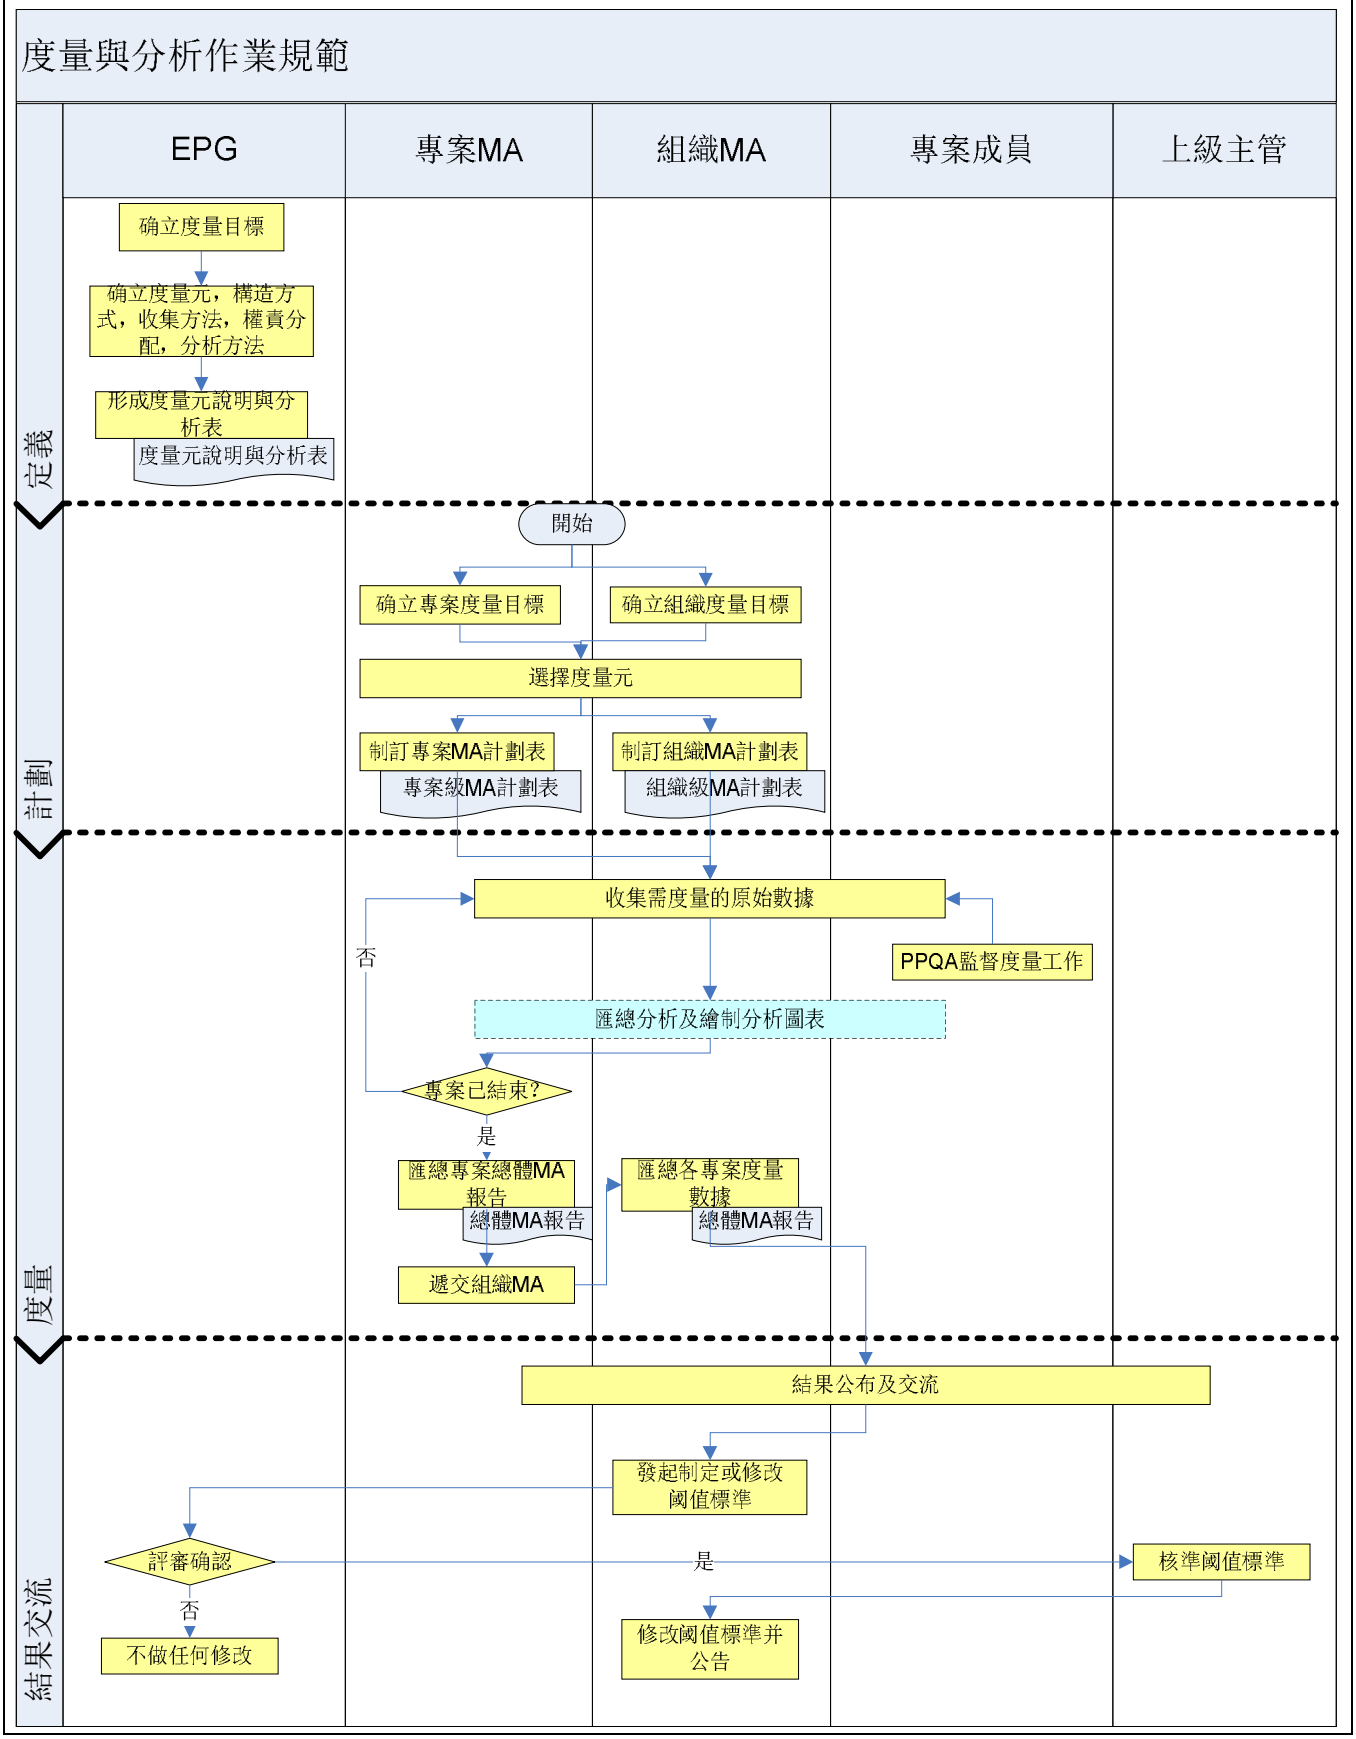

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

作業說明

8-1. 度量與分析定義

EPG 小組負責收集匯總各種度量需要(即度量目標), 制定或修改度量元、構造方式、收集方法、權責分配、分析方法等, 形成「度量元說明與分析表」。

8-1-1. 度量目標分為專案層級和組織級。

8-1-2. 組織級度量目標是針對組織過程改進而設立的。

8-1-3. 專案層級之度量是為掌控本專案的執行狀況，提供給 PM 作適當的決策，採取相應矯正措施。專案級的度量目標由 PM 依專案需求提報給 EPG；再由 EPG 連同組織級度量目標一同制定。

8-2. 計劃制訂階段

8-2-1. 專案級 MA 工程師根據本專案的度量目標選擇度量元，並制定本專案的度量計劃表「專案級 MA 計劃表」

8-2-2. 組織級 MA 工程師根據部門的度量目標選擇度量元，制定組織級度量元的度量計劃表「組織級 MA 計劃表」

8-3. 實施度量階段

8-3-1. 各角色人員分別收集原始資料進行度量，並進行匯總分析或圖表分析

8-3-2. 每角色所需度量的度量元請參見「度量元說明與分析表」

8-3-3. 如果專案已結束，專案級 MA 工程師需要向組織級 MA 工程師提報本專案的 MA 數據，以便制定組織的閾值標準及專案間 MA 參考。

8-3-4. 組織級 MA 工程師收到各專案的「總體 MA 報告」後，匯總生成組織級的「總體 MA 報告」

8-4. 結果交流及閾值制定

8-4-1. 組織級 MA 工程師需將「總體 MA 報告」公告給上級主管及組織內各成員知曉，並負責發起制定或修改閾值標準的會議，制定或修改閾值標準的前提條件是：

- 「總體 MA 報告」表中至少有 5 個專案的資料
- 各專案周期至少要 3 個月以上，成員 5 人以上
- 本次修改與上次修改間隔時間超過半年

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

- 閾值標準由 EPG 小組制定或修改，而不是組織級 MA 工程師

8-4-2. 上級主管核準閾值標準後公告執行

9. 允出準則

所有度量工作已按計劃完成并取得核準

10. 輸出

「度量元說明與分析表」，「度量與分析計劃書」，「總體專案度量與分析報告」，組織級度量結果在各自的報告中

11. 需要的知識與技能

知識與技能	上層主管	MA 工程師	專案成員	EPG
項目管理知識	V		V	V
統計知識		V	V	V

12. 需要的監督和控制

度量所花費的工作量及成本;

13. 裁剪指南

13-1. 「度量元說明與分析表」之度量元標注為可選項的可裁剪，且專案級可依專案管理需求增加度量元。

13-2. 度量目標及度量元可根據需要由 EPG 組進行增加。

14. 附件目錄

No.	名稱	文件編碼	備注
10-1	度量元說明與分析表	SDMS4-MA-002	
10-2	度量與分析計劃表	SDMS4-MA-001	
10-3	總體專案度量與分析報告	SDMS4-MA-003	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※
