FIH

系統文件編號:SDMS3-PI-001 B

系統實施作業規範

文件編碼: SDMS3-PI-002

版　　次: A

機密等級: □極機密 □機密 ■密 □普通

製作日期: 2008-12-16

製作單位: EPG

總 頁 次: 9

核　准	審　核	制　作	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

修 訂 履 歷

版次	變更單編號	發行日期	作者	修 訂 內 容	備 注
			鄧玉琳	初版發行	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

目　　錄

1　目的.....1
2　適用範圍.....1
3　名詞解釋.....1
4　參考文件.....1
5　權　　責.....1
6　允入準則.....2
7　輸入.....2
8　作業流程與說明.....2
9　允出準則.....5
10　輸出.....5
11　需要的知識與技能.....5
12　需要的監督與控制.....5
13　裁剪指南.....5
14　附件目錄.....5

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※　※

1 目的

本規程的目的是規定現場實施、驗收交付工作中的活動和步驟，以及相關的角色與職責，使得現場實施、驗收交付的集成工作有章可循。

2 適用範圍

本規範給 FIH 系統資訊處(一)各單位執行實施交付工作時提供作業依據與參考。

3 名詞解釋

參考《SDMS2-001_名詞解釋》

4 參考文件

《專案計劃書》、《客戶需求書》、《度量與分析計劃書》

5 權　　責

5.1 上級主管

5.1.1 審核系統測試結果。

5.1.2 審核正是上綫申請。

5.2 PM

5.2.1 編寫編寫試運行計劃。

5.2.2 審核正是上綫申請。

5.2.3 準備要交付的產品。

5.2.4 對實施過程中的系統修改進行變更控制。

5.3 實施人員

5.3.1 簽核試運行計劃。

5.3.2 對關鍵用戶、管理員進行教育訓練。

5.3.3 收集關鍵用戶的變更控制申請。

5.3.4 組織申請系統正是上綫、建立正是運行環境。

5.3.5 組織一般用戶分批教育訓練。

5.3.6 組織一般用戶分批推廣使用系統。

5.3.7 收集一般用戶的問題反饋，進行解答與相應處理

5.4 用戶

5.4.1 參與教育訓練；

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5.4.2 用戶驗收測試、反饋問題；

5.4.3 提出變更申請；

5.4.4 申請系統正是上綫；

5.4.5 進行系統配置、資料準備。

5.5 CM

5.5.1 將軟體集成的工作產品納入配置管理中。

6 允入準則

《系統測試報告》經過上級主管審核。


7 輸入

「系統測試報告」、「使用手冊」、「項目計劃書」、供測試上綫的系統。

8 作業流程與說明

8.1 作業流程

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

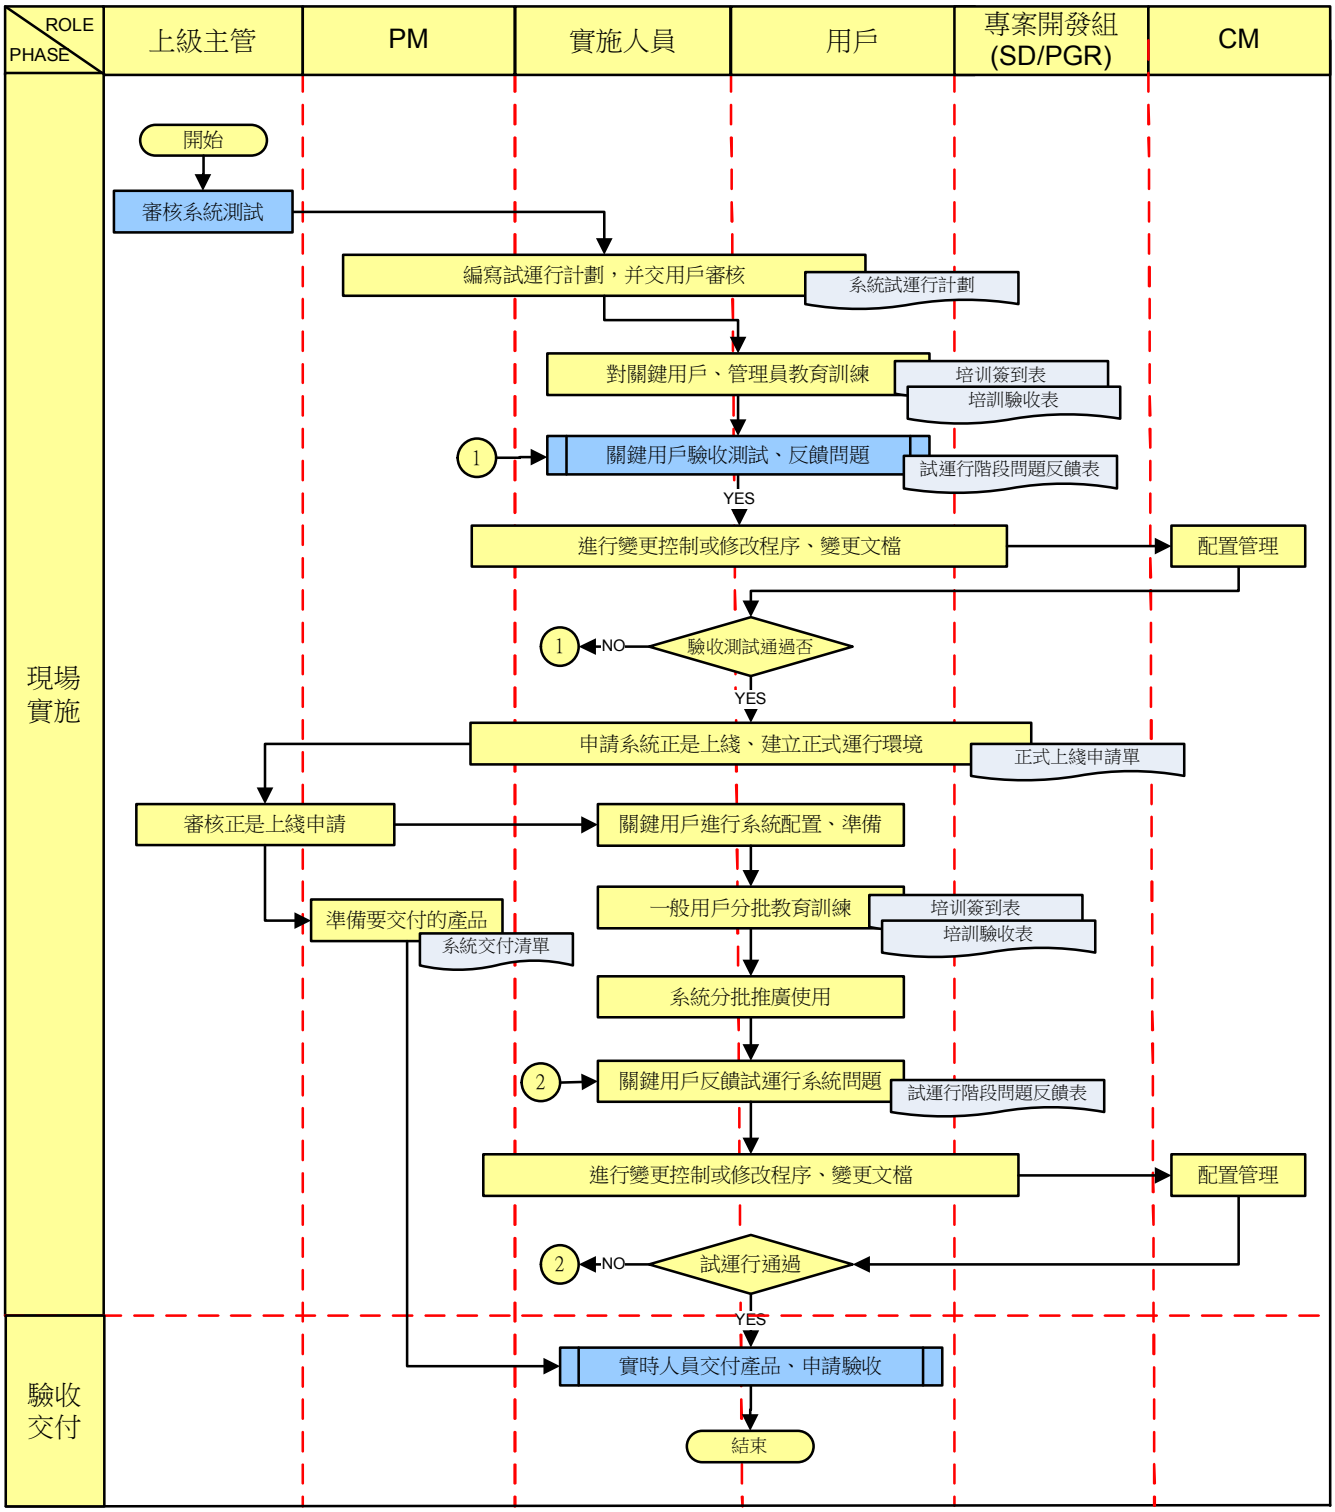

8.2 作業說明

8.2.1 編寫並審核試運行的計劃

1、PM 編寫「系統試運行計劃」。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

2、實施人員、用戶簽核「系統試運行計劃書」。

8.2.2 對關鍵用戶、管理員教育訓練

1、實施人員對關鍵用戶、管理員教育訓練。

2、關鍵用戶評價培訓效果,实施人员请关键用户填写 OT 过程域的「培訓驗收表」。

8.2.3 關鍵用戶驗收測試、反饋問題

1、實施人員指導關鍵用戶測試系統。

2、關鍵用戶測試系統，若發現問題，填寫「試運行階段問題反饋表」。

8.2.4 進行變更控制或修改程式、變更文檔

1、實施人員根據用戶反饋的問題，組織進行變更控制或修改程式。

2、專案開發組修改程式。

3、實施人員組織相關人員進行相關文檔的變更。

4、實施人員指導用戶對提出的問題驗收測試。

8.2.5 配置管理

由 CM 將軟體集成的工作產品納入配置管理中。

8.2.6 申請系統正是上綫、建立正是運行環境

1、實施人員填寫「系統正式上綫申請單」，指導用戶簽字。

2、用戶簽字「系統正式上綫申請單」。

3、系統開發組建立正式環境，並得到測試人員的簽字。

4、上級主管簽字「系統正式上綫申請單」。

8.2.7 關鍵用戶進行系統配置、準備

1、實施人員協助關鍵用戶進行系統配置、收集帳號、分配權限。

2、實施人員協助關鍵用戶進行基本數據的錄入。

8.2.8 一般用戶教育訓練與系統推廣使用

1、分批次對一般用戶進行教育訓練。

2、實施人員和關鍵用戶實施系統分批推廣使用。

3、關鍵用戶反饋試運行系統問題。

4、關鍵用戶反饋試運行系統問題。

5、實施人員根據用戶反饋的問題，組織進行變更控制或修改程式。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

6、實施人員指導用戶對提出的問題驗收測試。

8.2.9 準備要交付的產品

根據「系統交付清單」組織完成需要交付的產品。

9 允出準則

「試運行階段問題反饋表」中的問題已經關閉，用戶試運行通過。

10 輸出

「系統試運行計劃書」、「培训簽到表」(OT)、「試運行階段問題反饋表」、「正是上綫申請單」。

11 需要的知識與技能

知識與技能	上層主管	PM	實施人員	專案開發組	CM
項目管理知識	V	V	V		
開發能力				V	
一般需求分析		V	V		
配置管理能力					V

12 需要的監督與控制

實施過程發現的問題與解決的問題數；

實施過程的新增的需求數、需求穩定度；

實施時計劃、實際的開始時間和結束時間；

實施時計劃的工時與實際工時。

13 裁剪指南

本規範定義的過程和產品不允許裁減。

14 附件目錄

No.	附件名稱	文件編碼	備注
1	系統試運行計劃	SDMS4-PI-004	
2	培训簽到表		OT 过程域
3	培訓驗收表	SDMS4-PI-005	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

4	試運行階段問題反饋表	SDMS4-PI-006	
5	系統正式上綫申請單	SDMS4-PI-007	
6	系統交付清單	SDMS4-PI-008	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH 公司, 非經公司允許不得翻印 ※ ※
