FIH

系統文件編號: SDMS3-PM-003B

風險管理作業規範

文件編號:	SDMS3-PM-003
版　　次:	B
機密等級:	□極機密　□機密　■密　□普通
制作單位:	EPG
制作日期:	2008-03-31
總 頁 次:	10

核　准	審　核	制　作	

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

修 訂 履 歷

版次	變更單編號	發行日期	作者	修 訂 內 容	備 注
A		2008-03-31	朱優良	初版	
B		2008-06-26	朱優良	1、去除引用文檔名稱中的版次 2、更改本規範使之適用于組織級風險管理	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

目　　錄

1. 目的 3
2. 適用範圍 3
3. 名詞解釋 4
4. 參考文檔 4
5. 權責 4
6. 允入準則 4
7. 輸入 4
8. 作業流程與說明 5
9. 允出準則 8
10. 輸出 8
11. 需要的知識與技能 8
12. 需要的監督與控制 8
13. 裁減指南 9
14. 附件目錄 9

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

1. 目的

定義風險管理規範，用以識別潛在的問題，並策劃應對風險的活動，在必要時實施這些活動，緩解不利的影響。

2. 適用範圍

本規範適用於 FIH 系統資訊處（一）所有專案及組織過程中的風險管理。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

3. 名詞解釋

3-1. 請參考《SDMS2-001_名詞解釋》

4. 參考文檔

4-1. 《SDMS1-001_組織級方針》

4-2. 《SDMS2-001_名詞解釋》

4-3. 《SDMS3-OPD-003_組織級軟體生命週期模型》

4-4. 《SDMS3-PM-001_專案策劃和監控作業規範》

5. 權責

5-1. 專案經理（風險管理者）

5-1-1. 識別風險

5-1-2. 分析風險並確定優先級

5-1-3. 制定風險應對策略，編寫風險管理計劃

5-1-4. 跟蹤控制風險

5-1-5. 記錄風險跟蹤狀態，更新風險

5-2. 上層主管

5-2-1. 審核或批准風險，並解決風險緩解和應急所需的資源

5-3. EPG

5-3-1. 建立《風險管理策略說明》

5-3-2. 定期或事件驅動檢查風險選擇列表

5-3-3. 評審變更的《風險管理策略說明》

5-3-4. 更新組織級《風險管理策略說明》

6. 允入準則

《風險管理策略說明》已通過組織級評審。

7. 輸入


組織級《風險管理策略說明》。

管理層為風險管理活動提供足夠的資源。資源包括需要的資金、人員、設備和工具。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8. 作業流程與說明

8-1. 風險管理作業流程圖

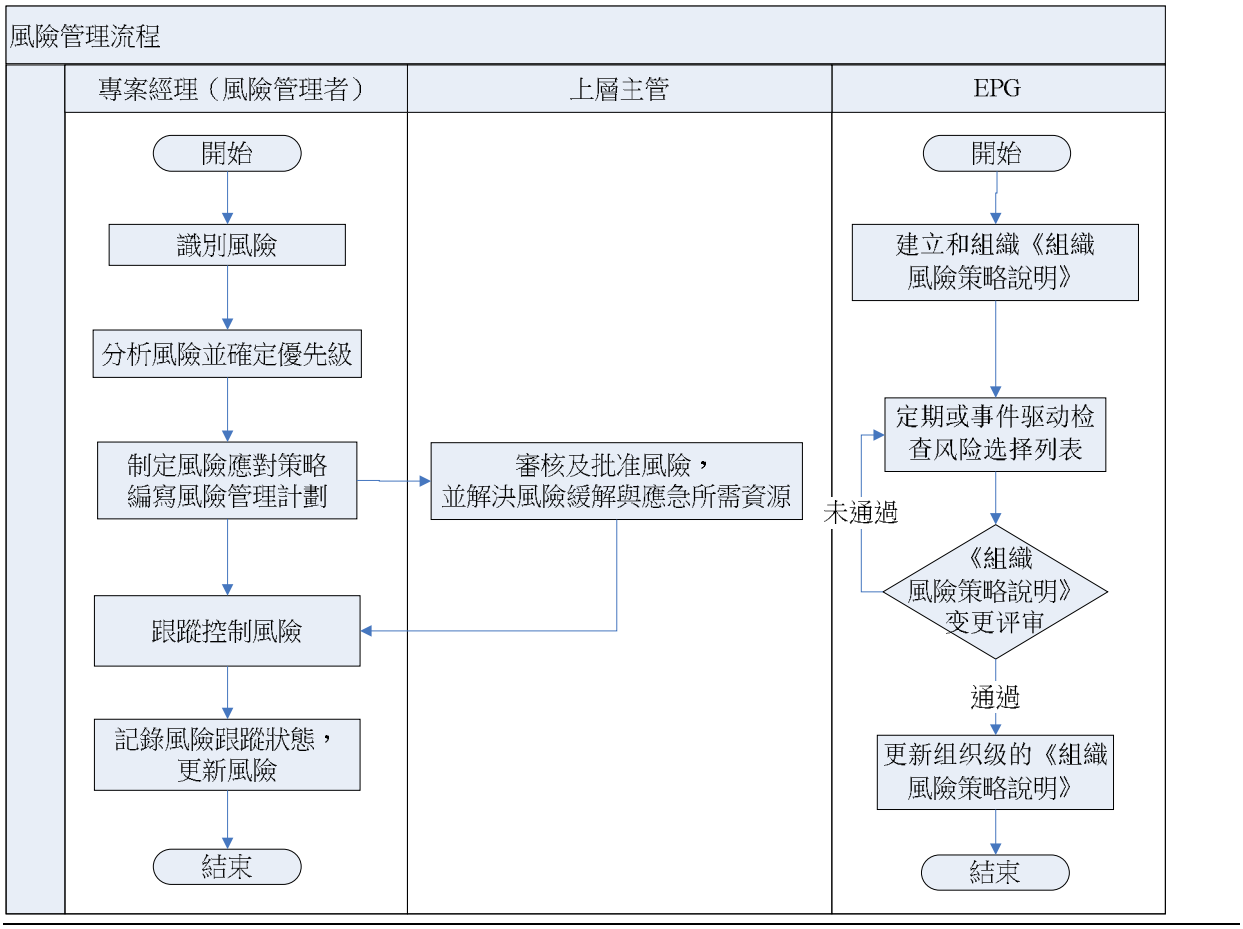

8-2. 風險管理作業描述

8-2-1. 識別風險

8-2-1-1. 專案經理（風險管理者）指導展開風險研討，必要時吸納專案相關人員參加，對進度計劃的工作分解結構（WBS）中所有工作活動中的風險進行識別。

8-2-1-2. 對風險的識別可以參照《風險管理策略說明》，對表中羅列的風險項，逐一研討其可能性。

8-2-1-3. 對專案風險的識別，還可以參考其他專案或當前專案的早期階段中識別出來的或發生過的風險。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-2-1-4. 專案經理（風險管理者）負責將識別出來的風險項記錄在《風險管理一覽表》中。

8-2-2. 分析風險參數，確定風險等級

風險分析從三個風險參數入手，根據具體情況分別確定，風險發生概率、風險影響程度和發生時段的量化值，以此為基礎利用風險等級公式計算出風險值，確定風險等級。

風險等級公式：風險等級＝風險發生概率*風險影響程度*發生時段

風險發生概率：（量化值為 1~3）是指風險發生的可能性。

風險影響程度：（量化值為 1~3）是指當風險發生時，從成本、進度和技術目標三方面可能會產生的綜合影響。

發生時段：（量化值為 1~3）根據完成時間跨度、風險的發生時間、解決風險的準備時間按三級量化評價。

風險等級：按照公式生成的風險值劃分風險等級標準。

8-2-3. 風險處理

專案經理（風險管理者）根據風險等級標準，制定風險應對策略，並確定責任人。

首先判斷風險發生時，帶來的後果是否可以承受，如果答案是肯定的，則可作接受處理，即不作任何風險管理工作。當風險發生時，當作問題處理，不再花費額外的資源管理；接受處理的另一種情況時，當緩解風險的成本比接受其發生更大時，可以作為接受處理。如果答案是否定的，則需要制定緩解計劃和應急計劃

緩解計劃：在適當的時間啟動的，可以降低風險發生概率、減少風險發生帶來的影響或推遲風險發生時間的措施。

應急計劃：風險發生時，採取行動，以減少風險發生帶來的影響。

對於高等級的風險，由專案經理（風險管理者）牽頭組織會議，請相關上層主管參加共同制定風險緩解和急應計劃。若風險項為本級別無法解決的風險，提交相關領導以尋求幫助。

對於中等級的風險項，建議專案經理（風險管理者）組織成員或部分人員以討論的方式，制定風險緩解和急應計劃。計劃需經上層主管審簽通過。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

對於低級的風險項，建議專案經理（風險管理者）組織成員或部分人員以討論的方式，制定風險緩解和急應計劃。

8-2-4. 風險跟蹤與控制

8-2-4-1. 風險跟蹤

專案經理(風險管理者)指定負責人將識別出來的風險全部填入《風險管理一覽表》中，並每周或事件驅動跟蹤控制表中風險參數和狀態。

風險跟蹤項：

風險跟蹤只針對《風險管理一覽表》中狀態為“未處理”和“緩解中”的風險。其中風險等級為高等級風險必須跟蹤，對於中等級和低等級的風險可以根據風險等級數值，只跟蹤前三項風險。

風險跟蹤狀態表：

狀態名稱	發生時段
未處理	指風險未發生，也未對其採取緩解措施
緩解中	專案已按照緩解計劃或應急計劃，實施了緩解行動，但未解決完成
已發生	風險已經發生，並記錄到問題追蹤表。
已關閉	通過緩解行動，風險消失；風險未發生，但已不存在。

8-2-4-2. 風險控制

專案經理（風險管理者）須每週對風險跟蹤項重新進行評估，以確定其概率、影響度和發生時段，並重新計算風險等級數值，是否發生了變化，必要時需對進行及時的變更。

專案經理（風險管理者）在執行的各個階段，需要再次對風險進行識別，確定新風險項的概率、影響度和發生時段，計算風險等級，並制定應對策略，必要時對《風險管理一覽表》（在狀態報告中）進行及時的變更，以確保風險管理的動態性和完整性。

8-2-5. EPG 組建立和組織《風險管理策略說明》

EPG 組參照行業內常見風險，並組織各級主管領導和相關專案經理評審，建立組織級《風險管理策略說明》。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-2-6. EPG 定期或事件驅動檢查風險列表

8-2-7. 《風險管理策略說明》變更評審

EPG 評審變更后的《風險管理策略說明》，如果不通過，重新檢查修改《風險管理策略說明》。

8-2-8. 風險選擇列表管理

專案或組織過程結束後，將《風險管理一覽表》上交組織過程資產庫。

EPG 組負責整理新識別的風險項，定期更新組織級的《風險管理策略說明》。必要時可以召集公司各級主管領導、專案經理、EPG 組成員及相關人員對《風險管理策略說明》的更新內容進行評審。

9. 允出準則

《風險管理一覽表》得到批准。

10. 輸出

《風險管理一覽表》

11. 需要的知識與技能

知識與技能	上層主管	專案經理（風險管理者）	EPG
風險識別、分類與分析	V	V	V
制定風險策略與緩解風險	V	V	V
風險跟蹤		V	

12. 需要的監督與控制

No.	度量元	度量單位
1	識別的風險數量	個數
2	關閉的風險數量	個數

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

13. 裁減指南

13-1. 本規範涉及的過程與產品不允許裁減。

14. 附件目錄

No.	附件名稱	文件編碼	備注
1	風險管理策略說明	SDMS4-PM-006	
2	風險管理一覽表	SDMS4-PM-016	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※
