FIH 系統資訊處(一)
組織標准過程裁剪指南

文件編號:SDMS3-0PD-004

版　　次:1.0

機密等級:　■機密　□密　□普通

製作日期:2008-08-18

製作單位:PG

總 頁 次:8

發行單位簽章			

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

修 訂 履 歷

版次	變更單編號	發行日期	作者	修 訂 內 容	備 注
A	--	2008-05-18	劉代標	初版發行	共 8 頁
B	--	2008-11-19	劉代標	將專案改爲依據工作量進行裁剪	
B		2009-2-24	劉代標	超過裁剪指南規定的部分,需 EPG 簽核改爲由高層簽核同意	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

目　　錄

1. 目　　的 3
2. 適用範圍 3
3. 名詞解釋 3
4. 參攷文件 3
5. 權責 3
6. 允入准則 4
7 輸入 4
8 作業流程與說明 4
9 允出准則 6
10 輸出 6
11 需要的知識與技能 6
12 需要的監督與控制 7
13 裁剪指南 7

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※　※

1. 目　　的

規範如何使用組織的標準過程和組織過程資產建立已定義的過程，並說明已定義過程必須滿足的強制性要求及在進行和記錄過程的裁減時必須遵循的步驟.

2. 適用範圍

本文檔適用於 FIH 系統資訊處(一) 組織標准過程裁剪

3. 名詞解釋

參考：<<SDMS2-001_名詞解釋>>

4. 參攷文件

<<SDMS4-PM-026_專案已定義過程>>

5. 權責

5-1 部級以上主管:
需要時參與評審裁剪指南

5-2 EPG 組:
5-2-1 建立、維護本裁剪指南
5-2-2 確保裁剪指南滿足模型和適合組織的實際需要
5-2-3 需要時，審批裁剪指南以外的裁剪

5-3 PM:
5-3-1 從專案管理的角度參與裁剪指南的評審活動
5-3-2 按照裁剪指南與專案的要求實施裁剪
5-3-3 提供在執行專案管理過程中發現的與裁剪指南有關的問題回饋

5-4 CM 工程師:
5-4-1 以配置管理的角度參與對裁剪指南的評審
5-4-2 按照已經裁剪的《專案已定義過程》執行
5-4-3 提供在執行配置管理活動中發現的與裁剪指南有關的問題回饋

5-5 MA 工程師:
5-5-1 以度量的角度參與對裁剪指南的評審
5-5-2 按照已經裁剪的《專案已定義過程》執行
5-5-3 提供在執行度量活動中發現的與裁剪指南有關的的問題回饋

5-6 PPQA 工程師:
5-6-1 以過程和產品品質保證的角度參與對裁剪指南的評審
5-6-2 提供執行 PPQA 活動中發現的與裁剪指南有關的問題回饋
5-6-3 檢查《專案已定義過程》的符合性

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※　※

5-7 設計工程師:
5-7-1 從工程實現的角度參與對裁剪指南的評審
5-7-2 按照已經裁剪的《專案已定義過程》(參見專案策劃和監控作業規範)執行
5-7-3 提供在執行工程過程中發現的與裁剪指南有關的問題回饋
5-8 測試工程師:
5-8-1 從產品驗證和確認的角度參與對裁剪指南的評審
5-8-2 按照已經裁剪的《專案已定義過程》執行
5-8-3 提供執行驗證和確認過程中發現的與裁剪指南有關的問題回饋

6. 允入准則

6-1 準備進行裁剪的生命週期模型已經選中；
6-2 準備進行裁剪組合的多個生命週期模型已經選中
6-3 專案對過程的需求已經清楚


7 輸入

7-1 準備進行裁剪的生命週期模型；
7-2 準備進行裁剪組合的多個生命週期模型
7-3 專案對過程的需求

8 作業流程與說明

8-1 作業流程

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

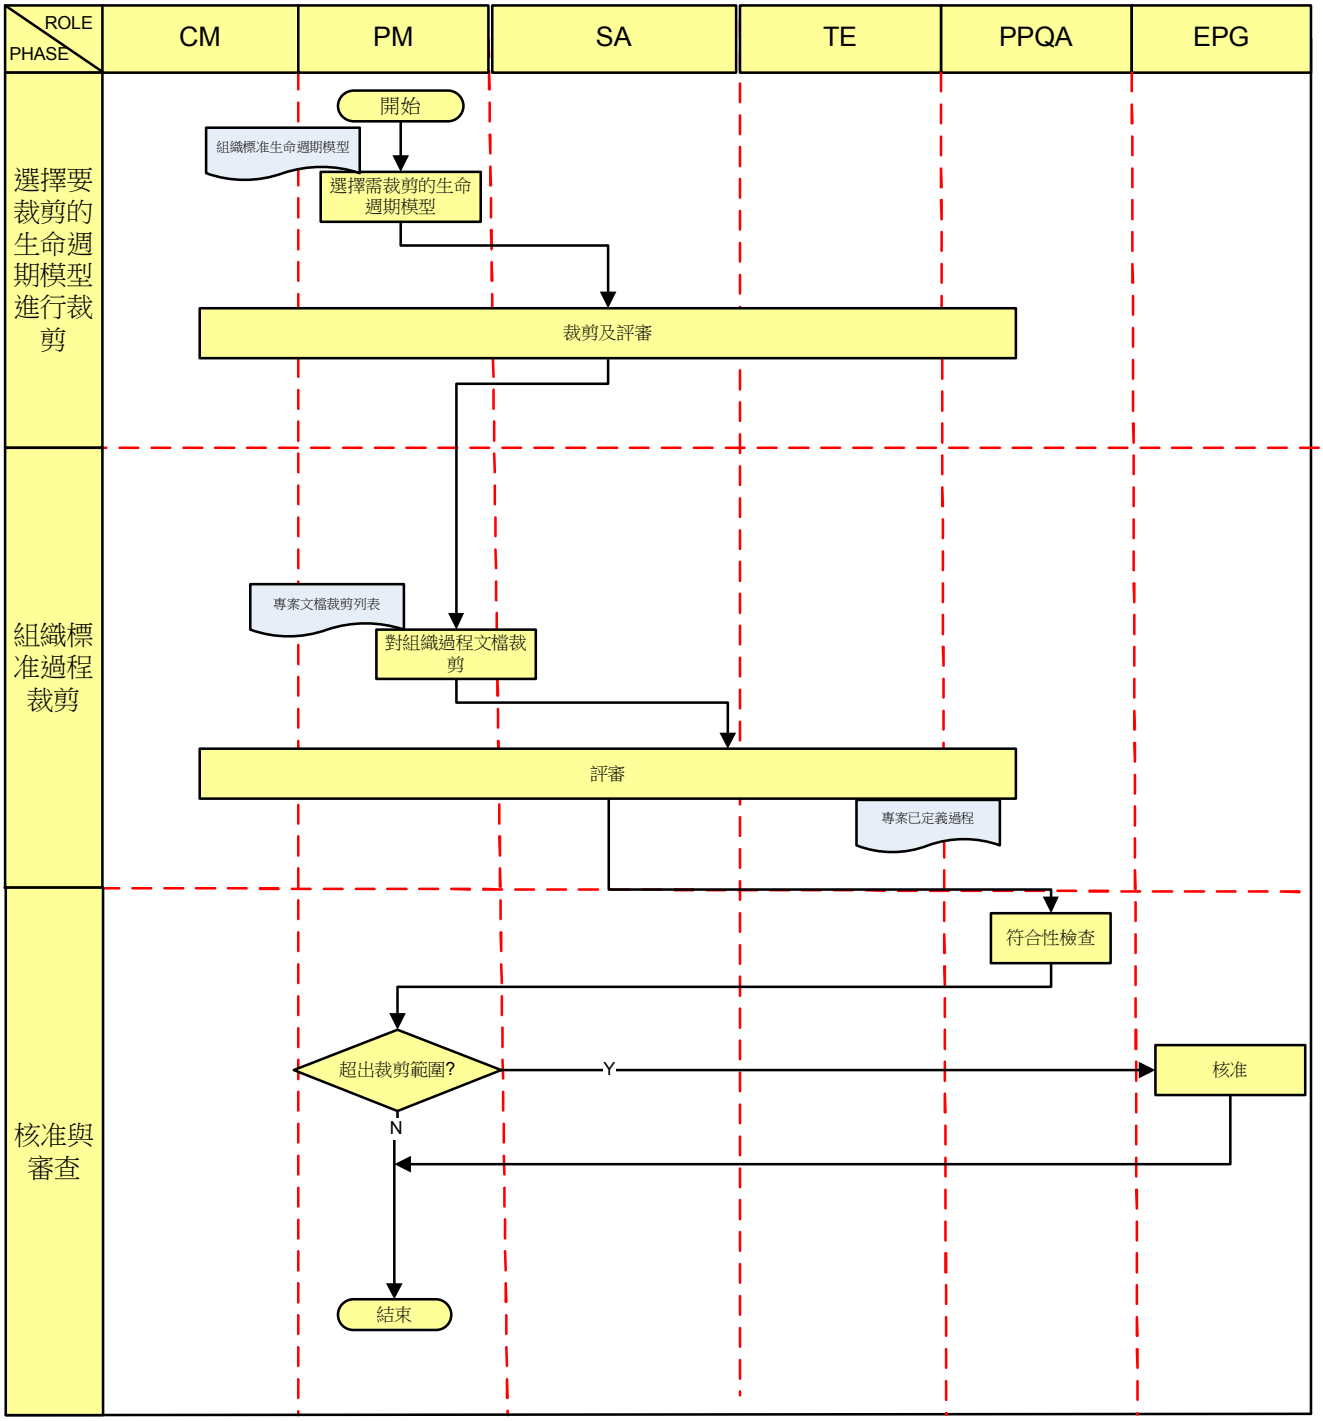

8-2 作業說明

8-2-1 根據組織級的生命週期模型，結合專案的需要對生命週期進行裁剪

8-2-1-1 對生命週期模型裁剪的含義：

1）修改生命週期模型；

在選中的生命週期模型的基礎上進行修改，並將描述填寫在《專案已定義過程》中

2）組合不同的生命週期元素；

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

在多個不同的生命週期模型中進行裁剪和組合，並將描述填寫在《專案已定義過程》中。

8-2-1-2 生命週期的裁剪準則, 參見<<組織級軟體生命週期模型>>中相關裁剪指南.

8-2-2 根據組織標準過程裁剪, 參見《組織標准過程列表》及《專案文檔裁剪列表》, 其中專案文檔按專案工作量分爲 3 個月(人日)以下、3－6 個月(人日)及 6 個月(人日)以上分別提供裁剪指南。

- 對過程活動裁剪方法的含義
  1）修改過程活動
  將過程活動的內容進行修改
  2）替換過程活動
  用其他過程活動代替原過程活動。
  3）重新排序過程活動
  在過程中已經規定了過程活動的執行順序，根據專案的需要對順序進行了重新安排
- 對工作產品裁剪方法的含義
  1) 修改工作產品的內容
  將過程活動後的工作產品的內容進行修改
  2）替換工作產品的內容
  用其他工作產品的部分內容代替原工作產品
  3）放棄工作產品
  在過程中已經規定輸出的工作產品，根據專案的需要決定放棄
- 裁剪其他說明：規範的內容原則上不允許刪減。

8-2-3 編寫《專案已定義過程》文檔

8-2-3-1 此文檔由 PM，或授權他人進行編寫；

8-2-3-2 裁剪的結果應當經過 PPQA 檢查其符合性

8-2-4 當裁剪超過裁剪指南規定的範圍時，需要經過 EPG 組的同意

9 允出准則

9-1-1《專案已定義過程》符合裁剪的要求，且通過 PPQA 的符合性檢查

9-1-2《專案已定義過程》有超過裁剪指南規定的部分時, 需高層經理簽核同意

10 輸出

《專案已定義過程》文檔,(參見<<專案策劃和監控作業規範>>相關文檔)

11 需要的知識與技能

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

知識和技能內容	培訓的角色
CMMI 和過程改進的參考模型、計劃和管理過程改進、工具，方法和分析技術、過程建模、簡化技術、變更管理	PM

12 需要的監督與控制

12-1 PPQA 檢查裁剪過程的符合性
12-2 如果超過裁剪標准，需 EPG 核准

13 裁剪指南

本過程不允許的裁剪

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FOXCONN, 非經公司允許不得翻印 ※ ※
