專案里程碑(階段)評審作業規範

文件編號:	SDMS3-PM-002
版　　次:	B
機密等級:	□極機密　□機密　■密　□普通
制作單位:	EPG
制作日期:	2008-03-31
總 頁 次:	8

核　准	審　核	制　作	

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

修 訂 履 歷

版次	變更單編號	發行日期	作者	修 訂 內 容	備 注
A		2008-03-31	朱優良	初版	
B		2008-06-26	朱優良	去除引用文檔的版次	
B		2008-08-3	朱優良	1、修改文檔的格式錯誤 2、修改本文檔使之同樣適用于階段評審	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

目　　錄

1. 目的.....3
2. 適用範圍.....3
3. 名詞解釋.....3
4. 參考文檔.....3
5. 權責.....3
6. 允入準則.....4
7. 輸入.....4
8. 作業流程與說明.....4
9. 允出準則.....7
10. 輸出.....7
11. 需要的知識與技能.....7
12. 需要的監督與控制.....8
13. 裁剪指南.....8
14. 附件目錄.....8

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※　※

1. 目的

本文檔規定了 FIH 系統資訊處（一）專案里程碑(階段)評審的內容、執行方法和必要的規則，為里程碑(階段)評審提供依據和參考。

2. 適用範圍

2-1. 適用於 FIH 系統資訊處（一）的所有系統開發專案。

2-2. 本規範既適用於里程碑評審，也適用于階段評審。

3. 名詞解釋

3-1. 請參考《SDMS2-001_名詞解釋》

4. 參考文檔

4-1. 《SDMS1-001_組織級方針》

4-2. 《SDMS2-001_名詞解釋》

4-3. 《SDMS3-OPD-003_組織級軟體生命週期模型》

4-4. 《SDMS3-PM-001_專案策劃和監控作業規範》

5. 權責

5-1. 上層主管

參與里程碑(階段)評審，為下一步工作提出意見，必要時協助解決資源需求。

批准里程碑(階段)評審報告。

5-2. 專案經理

準備階段總結報告、專案跟蹤和監控報告、風險評估報告。

主持里程碑(階段)評審工作。

填寫《專案里程碑(階段)評審報告》。

5-3. 專案成員（含系統分析師、系統設計師、開發工程師、度量分析工程師）

協助專案經理準備評審資料。

參與里程碑(階段)評審。

5-4. 測試工程師

準備測試報告等相關測試資料。

參與里程碑(階段)評審，並報告測試問題。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5-5. 配置管理工程師

準備待評審的階段工作產品清單和配置庫狀態報告。

參與里程碑(階段)評審。

5-6. 品質保證工程師

準備品質保證審計報告。

參與里程碑(階段)評審。

檢查評審過程的符合性以及問題處理結果及跟蹤情況。

5-7. 相關人員

必要時參與里程碑(階段)評審，提出工作意見和建議。

6. 允入準則

6-1. 《專案計劃書》已經定義了里程碑計劃，並且已經處於規定的里程碑(階段)評審時機；

6-2. 該里程碑(階段)的所有工作產品均已經通過了技術評審。

7. 輸入

7-1. 《專案計劃書》

7-2. 《專案進度表》

7-3. 《專案資料管理計劃與追蹤記錄》

7-4. 該里程碑(階段)相關技術評審報告

7-5. 《專案問題追蹤表》

7-6. 《專案風險管理一覽表》

7-7. 《測試報告》（存在測試工作時提供）

7-8. 《PPQA 階段報告》


7-9. 《總體專案度量與分析報告》

7-10. 《CM 階段報告》

8. 作業流程與說明

里程碑(階段)評審必須以會議的形式進行。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

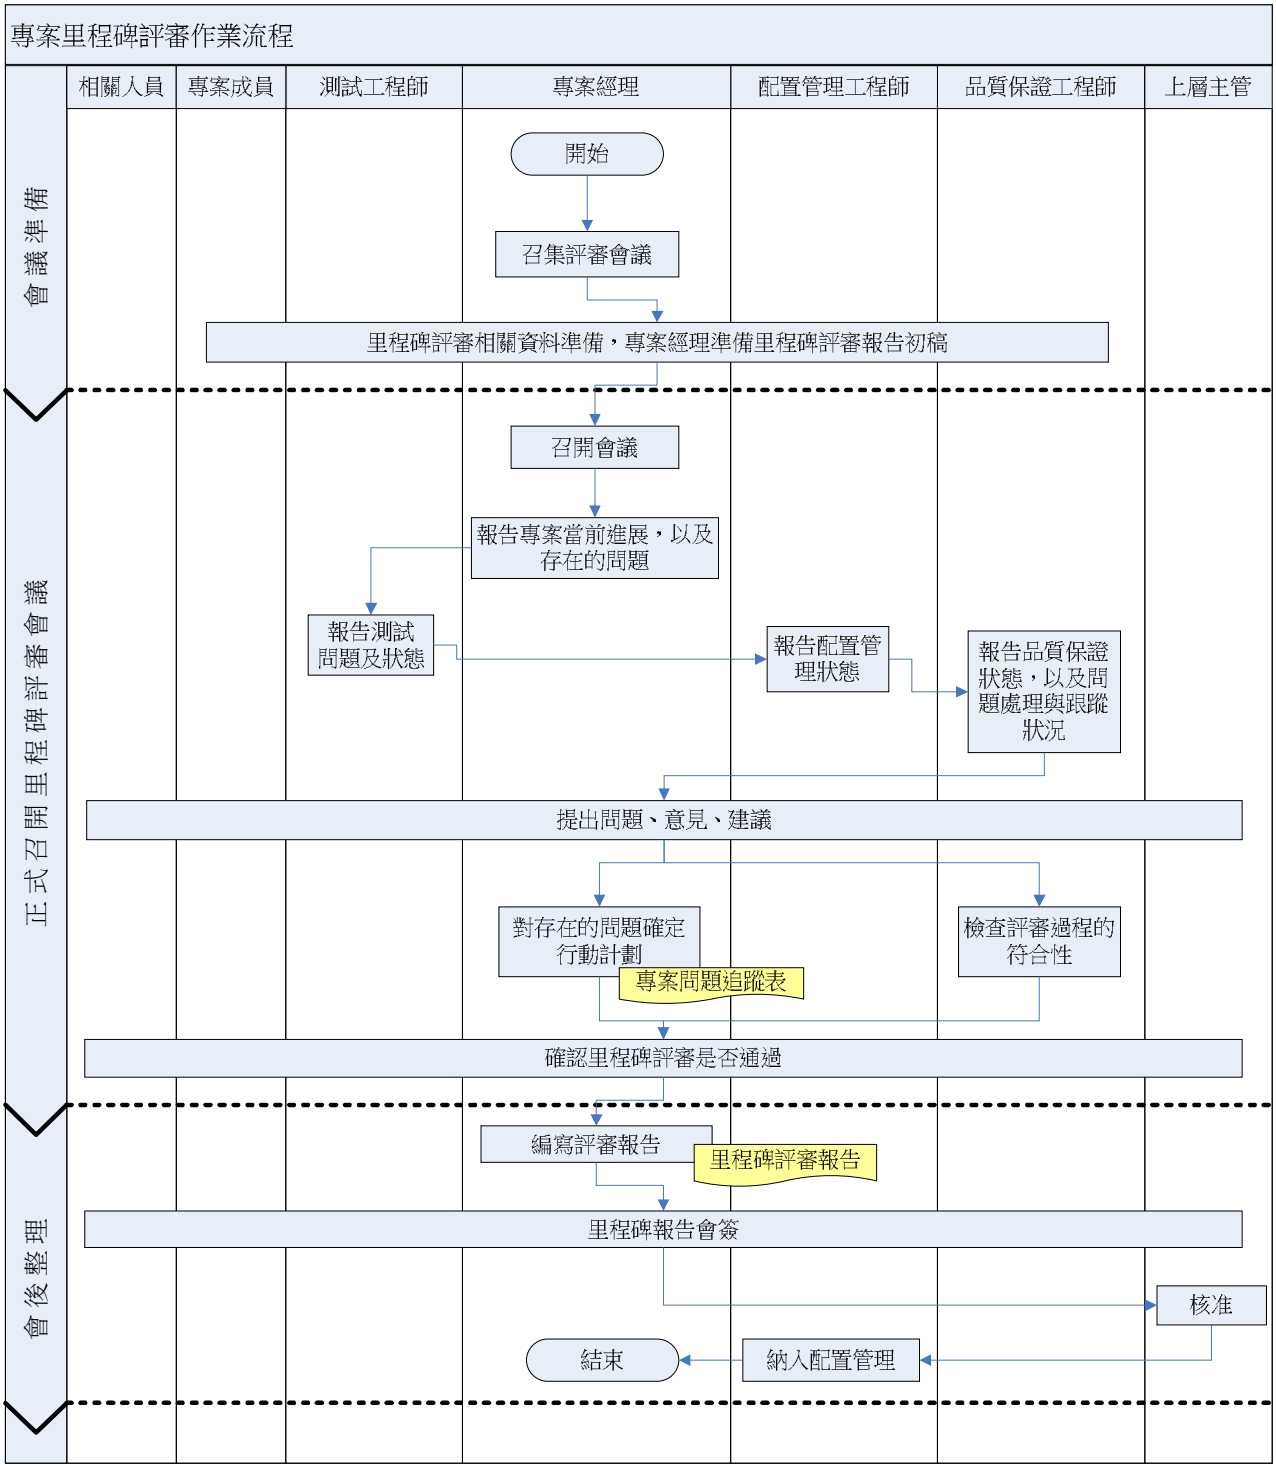

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-1-1. 會議準備

8-1-1-1. 專案經理召集會議

確定會議內容、評審人員（與會人員）、每個人的職責，並準備會議室及相關設備。

8-1-1-2. 相關資料準備

專案經理發送評審會議通知給所有與會人員，並由各負責人準備評審相關資料。

編號	資料	負責人
1	《專案進度表》	專案經理
2	《專案計劃書》	專案經理
3	《專案資料管理計劃與追蹤記錄》	專案經理
4	相關技術評審報告	專案經理
5	《專案問題跟蹤表》	專案經理
6	《風險管理一覽表》	專案經理
7	《專案里程碑(階段)評審報告》初稿	專案經理
8	《測試報告》	測試工程師
9	《PPQA 階段報告》	品質保證工程師
10	《CM 階段報告》	配置管理工程師
11	《MA 階段報告》	度量分析工程師

8-1-2. 正式評審

8-1-2-1. 專案經理依據《專案里程碑(階段)評審報告》初稿報告專案進展狀況，以及可能存在的問題。

8-1-2-2. 如果專案當前有測試活動，則測試工程師報告測試問題及當前狀態。

8-1-2-3. 配置管理工程師報告專案的各項工作產品納入配置管理的狀況，以及配置項變更處理的狀況和問題。

8-1-2-4. 品質保證工程師報告專案過程和工作產品在品質保證審查上存在的問題處理

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

和跟蹤狀況。

8-1-2-5. 所有與會人員提出問題和意見、建議。

8-1-2-6. 專案經理對存在的問題進行分析，並確定糾正行動計劃。

8-1-2-7. 品質保證工程師檢查本次里程碑(階段)評審過程是否符合規範。

8-1-2-8. 共同確認本次里程碑(階段)評審是否有效，專案是否可以轉入下一階段。

8-1-3. 會後整理

8-1-3-1. 編寫評審報告：專案經理根據會議記錄編寫完整的《專案里程碑(階段)評審報告》。

8-1-3-2. 評審報告簽核：評審報告交由參與會議的所有人員簽字，再由上層主管核准。

8-1-3-3. 納入配置管理：配置管理工程師將評審報告納入配置管理。

9. 允出準則

9-1. 計劃產出的所有工作產品，按規範納入配置管理。

9-2. 對未關閉的問題點提出進一步的對策及關閉計劃。

9-3. 細化了下一階段的 WBS，即完成了專案進度表的進一步細化。

9-4. 《專案里程碑(階段)評審報告》被批准。

10. 輸出

10-1. 《專案里程碑(階段)評審報告》

11. 需要的知識與技能

知識與技能	上層主管	專案經理	專案成員	測試工程師	配置管理工程師	品質保證工程師	度量分析工程師
CMMI L3 知識	V	V	V	V	V	V	V
里程碑(階段)評審流程	V	V	V	V	V	V	V
里程碑(階段)評審		V		V	V	V	V

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

所需要準備的資料							
編寫里程碑(階段)評審報告		V					

12. 需要的監督與控制

No.	度量元	度量單位
1	里程碑(階段)評審會議前發現的問題數量	個
2	里程碑(階段)評審會議上發現的問題數量	個
3	里程碑(階段)評審會議所花費的工作量	人日

13. 裁剪指南

13-1. 如果本里程碑(階段)不包含(或不是)測試階段，則可以不需要測試工程師報告測試狀況。

14. 附件目錄

No.	附件名稱	文件編碼	備注
1	專案計劃書	SDMS4-PM-007	
2	需求規格書	SDMS4-RM-005	
3	專案承攬單	SDMS4-PM-002	
4	專案工作量和成本估計記錄	SDMS4-PM-009	
5	專案進度表	SDMS4-PM-008	
6	專案資料管理計劃與追蹤記錄	SDMS4-PM-014	
7	專案風險管理一覽表	SDMS4-PM-016	
8	專案培訓計劃追蹤表	SDMS4-PM-015	
9	專案計劃書	SDMS4-PM-007	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

10	專案相關人員參與追蹤表	SDMS4-PM-013	
11	專案問題追蹤表	SDMS4-PM-018	
12	專案里程碑(階段)評審報告	SDMS4-PM-022	
13	測試報告	SDMS4-VER-003	
14	CM 階段報告	SDMS4-CM-008	
15	PPQA 階段報告	SDMS4-PPQA-003	
16	總體專案度量與分析報告	SDMS4-MA-003	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※
